



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA

INTERVENTI RELATIVI AL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: SISTEMAZIONE TRATTO
TERMINALE TORRENTE MORSINA E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN DESTRA
IDRAULICA TORRENTE APSA
LOTTO 1

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato:

EC.04

Titolo:

**ELABORATI CONTRATTUALI
Cronoprogramma**

Scala:

-

Revisione

0

Data

Firma

Ing. Dante LEONI (EDILING srl)

Progettazione: EDILING srl

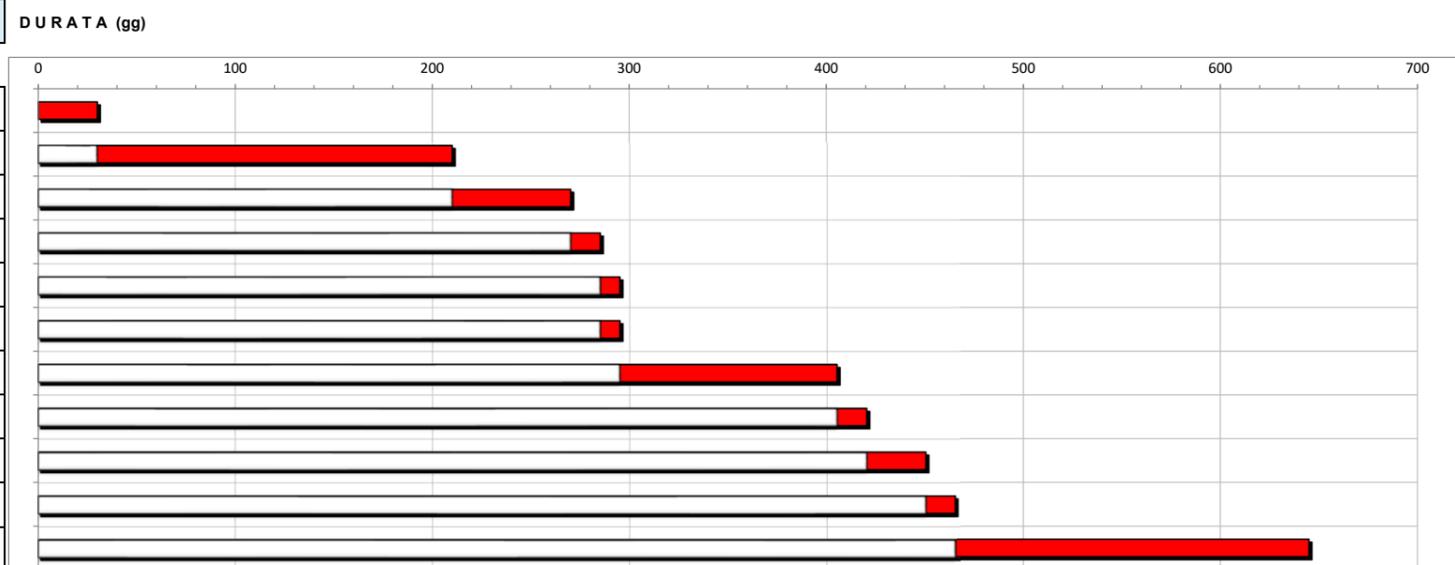

— SOCIETÀ DI INGEGNERIA —
Ing. Dante LEONI (Capogruppo)

IL RUP:
Arch. Jenny Giovannini

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E DEI LAVORI

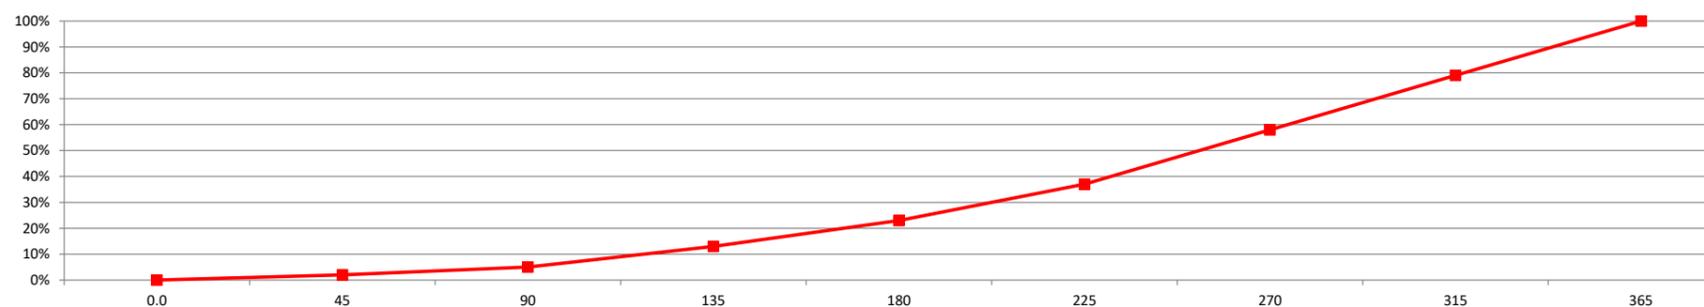
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA
 INTERVENTI RELATIVI AL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE TORRENTE MORSINA E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN DESTRA IDRAULICA TORRENTE APSA - LOTTO 1

N. fase	Attività	Inizio	Fine	Durata singola fase gg.
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	10/09/2021	10/10/2021	30
2	Procedura di affidamento lavori	10/10/2021	08/04/2022	180
3	Stipula contratto	08/04/2022	07/06/2022	60
4	Consegna lavori	07/06/2022	22/06/2022	15
5	Consegna cantiere	22/06/2022	02/07/2022	10
6	Concreto avvio opere	22/06/2022	02/07/2022	10
7	Sistemazione tratto terminale torrente Morsina	02/07/2022	20/10/2022	110
8	Realizzazione opere di completamento e valorizzazione	20/10/2022	04/11/2022	15
9	Sistemazione versante in frana del torrente Apsa	04/11/2022	04/12/2022	30
10	Smobilizzo del cantiere e CONCLUSIONE LAVORI	04/12/2022	19/12/2022	15
11	Collaudo tecnico amministrativo (collaudo provvisorio)	19/12/2022	17/06/2023	180



Produttività di cantiere

Giorni di durata del cantiere	0.0	45	90	135	180	225	270	315	365
AVANZAMENTO PARZIALE DEL CANTIERE SU BASE MENSE (IMPORTO NETTO LAVORI)	€ -	€ 5,721.90	€ 14,304.75	€ 37,192.35	€ 65,801.85	€ 105,855.15	€ 165,935.09	€ 226,015.04	€ 286,094.99
AVANZAMENTO PROGRESSIVO DEL CANTIERE IN PERCENTUALE ALL'IMPORTO OFFERTO SU BASE MENSILE	0%	2%	5%	13%	23%	37%	58%	79%	100%



Tempo esecuzione lavori previsto (gg naturali e consecutivi)

180 giorni

Importo netto offerto

€ **286,094.99**
